

宮古市復興交付金事業計画の 実績に関する評価

令和4年12月
岩手県宮古市

宮古市復興交付金事業計画の実績に関する評価

目次

1	総合評価	1
2	個別評価（宮古市実施分 基幹事業及び効果促進事業）	
2-1	文部科学省（A）事業	
(1)	埋蔵文化財発掘調査事業（A-4-1）	9
2-2	農林水産省（C）事業	
(1)	宮古市広域総合交流促進施設整備事業（C-2-1）	14
(2)	観光客誘客促進事業（◆C-2-1-1）	17
(3)	浄土ヶ浜地区環境整備事業（◆C-2-1-2）	19
(4)	宮古市広域総合交流促進施設駐車場等整備事業（◆C-2-1-3）	22
(5)	浄土ヶ浜前トイレ復旧事業（◆C-2-1-4）	25
(6)	農山漁村地域施設整備事業（C-2-2）	28
(7)	野外活動交流促進施設整備事業（C-2-3）	31
(8)	野外活動交流促進施設津波避難路整備事業（◆C-2-3-1）	34
(9)	生産者再建支援事業（C-4-1）	37
(10)	摂待地区漁業集落防災機能強化事業（C-5-1）	45
(11)	堀内地区漁業集落防災機能強化事業（C-5-2）	48
(12)	浦の沢・追切地区漁業集落防災機能強化事業（C-5-3）	51
(13)	音部漁港地区漁業集落防災機能強化事業（C-5-4）	54
(14)	重茂漁港地区漁業集落防災機能強化事業（C-5-5）	57
(15)	千鷲地区漁業集落防災機能強化事業（C-5-6）	61
(16)	千鷲小学校擁壁改修事業（◆C-5-6-1）	64
(17)	女遊戸地区漁業集落防災機能強化事業（C-5-7）	67
(18)	白浜地区漁業集落防災機能強化事業（C-5-8）	70
(19)	石浜地区漁業集落防災機能強化事業（C-5-9）	73
(20)	田老野原地区漁業集落防災機能強化事業（C-5-10）	76
(21)	漁港施設機能強化事業（C-6-1）	79
(22)	水産業共同利用施設復興整備事業（水産加工流通振興タイプ） （C-7-1）	95
(23)	水産経営復興対策事業（◆C-7-1-1）	119
(24)	産業復興総合支援事業（◆C-7-1-2）	122
(25)	水産業共同利用施設復興整備事業（漁港施設復興関係）（C-7-2）	128

(26)	宮古市魚市場整備事業 (C-7-3)	146
(27)	宮古市魚市場整備事業 (用地) (◆C-7-3-1)	150
(28)	宮古市魚市場(既設棟)改修事業 (◆C-7-3-2)	155
(29)	宮古市鍬ヶ崎地区水産加工団地整備事業 (施設) (C-7-4)	158
(30)	海洋汚染防止機材保管倉庫整備事業 (C-7-5)	161
(31)	再生可能エネルギープロジェクト推進事業 (再生可能エネルギー導入による産業振興事業) (◆C-9-1-1)	164
2-3 国土交通省 (D) 事業		
(1)	(仮称) 胡瓜沢線道路整備事業 (D-1-9)	165
(2)	磯鷄金浜線 (金浜工区) 道路整備事業 (D-1-10)	168
(3)	(仮称) 赤前上下線道路整備事業 (D-1-11)	171
(4)	(仮称) 新田平乙部線道路整備事業 (D-1-12)	174
(5)	駒形1号線道路整備事業 (D-1-13)	177
(6)	(仮称) 釜ヶ沢東線道路整備事業 (D-1-14)	180
(7)	(仮称) 金浜3号線道路整備事業 (D-1-15)	183
(8)	高浜地区道路整備事業 (D-1-16)	186
(9)	災害公営住宅整備事業 (宮古地区) (D-4-1)	189
(10)	公営住宅長寿命化計画策定事業 (◆D-4-1-1)	195
(11)	災害公営住宅管理システム整備事業 (◆D-4-1-3)	196
(12)	災害公営住宅建設に係る既存建物除去事業 (◆D-4-1-4)	197
(13)	災害公営住宅駐車場整備事業 (◆D-4-1-5)	200
(14)	災害公営住宅建設 (改修) に係る既存入居者移転事業 (◆D-4-1-6)	206
(15)	災害公営住宅整備事業 (D-4-2)	208
(16)	災害公営住宅整備事業 (宮古北地区) (D-4-6)	211
(17)	災害公営住宅整備事業 (宮古南地区) (D-4-7-1・D-4-7-2)	215
(18)	災害公営住宅整備事業 (田老地区) (D-4-8)	219
(19)	災害公営住宅整備事業 (重茂地区) (D-4-9)	223
(20)	災害公営住宅家賃低廉化事業 (D-5-2)	226
(21)	災害公営住宅家賃低廉化事業 (補助率変更分) (D-5-3)	227
(22)	東日本大震災特別家賃低減事業 (D-6-2)	228
(23)	危険住宅移転事業 (D-13-1)	229
(24)	中心市街地津波復興拠点整備事業 (D-15-1)	230
(25)	津軽石地区津波復興拠点整備事業 (D-15-2)	233
(26)	法の脇地区津波浸水防護施設整備事業 (◆D-15-2-1)	236
(27)	田老地区都市再生区画整理事業計画案作成事業 (D-17-1)	239

(28)	野原地区都市再生区画整理事業計画案作成事業 (D-17-2)	241
(29)	鍬ヶ崎地区都市再生区画整理事業計画案作成事業 (D-17-3) ...	243
(30)	津軽石・赤前地区都市再生区画整理事業計画案作成事業 (D-17-4)	245
(31)	鍬ヶ崎地区緊急防災空地整備事業 (D-17-5)	247
(32)	田老地区都市再生区画整理事業 (D-17-6)	249
(33)	津波遺構保存整備事業 (◆D-17-6-1)	252
(34)	鍬ヶ崎・光岸地地区都市再生区画整理事業 (D-17-8)	255
(35)	鍬ヶ崎・光岸地地区内水面对策事業 (◆D-17-8-1)	258
(36)	宮古市復興まちづくり計画策定事業 (被災地における復興まち づくり総合支援事業) (D-20-1)	261
(37)	津波遺構保存整備事業 (◆D-20-1-1)	263
(38)	総合防災推進事業 (D-20-2)	266
(39)	東日本大震災記憶伝承事業 (◆D-20-2-1)	267
(40)	津波避難誘導施設整備事業 (◆D-20-2-2)	268
(41)	地域防災力向上促進事業 (◆D-20-2-3)	272
(42)	災害用給水機材等格納倉庫整備事業 (◆D-20-2-4)	274
(43)	給水車整備事業 (◆D-20-2-5)	279
(44)	藤原地区津波避難路整備事業 (D-20-3・D-20-4)	283
(45)	浸水対策事業 (D-21-1)	288
(46)	鍬ヶ崎・光岸地地区公共下水道整備事業 (D-21-2)	291
(47)	田老地区公共下水道整備事業 (D-21-3)	294
(48)	藤原上町都市公園事業 (D-22-1)	297
(49)	越田山都市公園事業 (D-22-2)	299
(50)	館山都市公園事業 (D-22-3)	301
(51)	田老地区防災集団移転促進事業 (D-23-1・D-23-1-1)	303
(52)	公共交通体系構築事業 (◆D-23-1-1)	306
(53)	金浜北地区防災集団移転促進事業 (D-23-2・D-23-2-1)	307
(54)	金浜南地区防災集団移転促進事業 (D-23-3・D-23-3-1)	310
(55)	法の脇地区防災集団移転促進事業 (D-23-4・D-23-4-1)	313
(56)	赤前上地区防災集団移転促進事業 (D-23-5・D-23-5-1)	316
(57)	赤前下地区防災集団移転促進事業 (D-23-6・D-23-6-1)	319
(58)	釜ヶ沢地区防災集団移転促進事業 (D-23-7・D-23-7-1)	322
(59)	駒形通地区防災集団移転促進事業 (D-23-8・D-23-8-1)	325
(60)	崎山地区防災集団移転促進事業 (D-23-9・D-23-9-1)	328
(61)	高浜・金浜地区防災集団移転促進事業 (D-23-10)	331

(62)	赤前地区防災集団移転促進事業 (D-23-11)	334
(63)	埋蔵文化財整理収蔵施設整備事業 (◆D-23-11-1)	337
2-4	環境省 (E) 事業	
(1)	浄化槽整備事業(市町村設置型) (E-1-1)	340
3	個別評価 (宮古市実施分 効果促進事業一括配分)	
3-1	農林水産省 (☆F/☆C) 事業	
(1)	水産体験交流施設整備事業 (☆C-5-5-7)	341
3-2	国土交通省 (★F/★D) 事業	
(1)	公園機能回復事業 (★D-4-1-5)	344
(2)	市道八幡沖踏切線道路改良整備事業 (★D-15-1-15)	366
(3)	田老地区都市再生区画整理調査設計事業 (★D-17-1-1)	369
(4)	鍬ヶ崎・光岸地地区都市再生区画整理調査設計事業 (★D-17-3-1)	372
(5)	田老地区がれき除去・撤去事業 (★D-17-6-1)	375
(6)	田老地区都市再生区画整理事業に伴う下水道整備事業 (★D-17-6-2)	378
(7)	田老地区産直・交流施設整備事業 (★D-17-6-9)	381
(8)	被災地区における観光資源環境整備事業 (★D-17-6-10)	384
(9)	鍬ヶ崎・光岸地地区がれき除去・撤去事業 (★D-17-8-1)	387
(10)	鍬ヶ崎光岸地地区都市再生区画整理事業に伴う下水道整備事業 (★D-17-8-3)	390
(11)	防災集団移転促進事業に伴う業務支援事業 (田老地区防災集団 移転促進事業地内) (★D-23-1-4)	393
(12)	日出島地区津波避難路整備事業 (★D-23-9-1)	396
4	個別評価 (岩手県実施分 基幹事業及び効果促進事業)	
4-1	文部科学省 (A) 事業	
(1)	遺跡調査事業 (震災復興支援) (A-4-2)	399
(2)	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業 (◆A-4-2-1)	403
4-2	農林水産省 (C) 事業	
(1)	農用地災害復旧関連区画整理事業 (復興基盤総合整備事業) (C-1-1)	407
(2)	復興基盤総合整備事業 (復興整備実施計画) (C-1-2)	413
4-3	国土交通省 (D) 事業	
(1)	まちづくり連携道路整備事業 (D-1-1)	417

(2) まちづくり連携道路調査事業 (道路) (◆D-1-1-1)	420
(3) まちづくり連携道路整備事業 (D-1-3)	423
(4) まちづくり連携道路整備事業 (D-1-4)	426
(5) まちづくり連携道路整備事業 (D-1-5)	429
(6) まちづくり連携道路整備事業 (D-1-6)	433
(7) まちづくり連携道路整備事業 (D-1-7)	436
(8) まちづくり連携道路整備事業 (D-1-8)	439
(9) 災害公営住宅整備事業 (D-4-3)	442
(10) 災害復興公営住宅駐車場整備事業 (◆D-4-3-1)	480
(11) 県営住宅システム改修事業 (◆D-4-3-1)	507
(12) 住宅再建相談会 宮古市内 (◆D-4-3-2)	510
(13) 災害復興型地域優良賃貸住宅整備事業 (D-4-4)	515
(14) 災害公営住宅等整備事業 (D-4-5)	518
(15) 災害公営住宅家賃低廉化事業 (D-5-1)	522
(16) 災害公営住宅家賃低廉化事業 (D-5-4)	525
(17) 東日本大震災特別家賃低減事業 (D-6-1)	528

5 個別評価 (岩手県実施分 効果促進事業一括配分)

5-1 農林水産省 (☆C) 事業

(1) 田老地区漁港機能強化事業 (☆C-5-10-1)	531
------------------------------------	-----

5-2 国土交通省 (★D) 事業

(1) 簡易仮設宿泊施設整備事業 (★D-23-11-4)	535
-------------------------------------	-----

【復興交付金事業計画の総合的な実績に関する評価様式】

計画名称 宮古市復興交付金事業計画	
計画策定主体 岩手県・宮古市	
計画期間 平成 23 年度～令和 2 年度 ※繰越事業完了は令和 3 年度	
計画に係る事業数 138 事業 計画に係る事業費の総額 1,082 億円（県：319 億円、市：763 億円）	
東日本大震災による被害の状況に対応した復興まちづくりの現況 【被災状況】 (1) 人的被害 死者 517 人（うち行方不明者 94 人） (2) 住家被害 4,449 棟（全壊 2,677 棟、大規模半壊 688 棟、半壊 640 棟、一部損壊 444 棟） (3) 非住家被害 4,639 棟（全壊 3,291 棟、大規模半壊 647 棟、半壊 534 棟、一部損壊 167 棟） (4) 被害推計額 総額 2,457 億円 ※国・県の施設、鉄道、電信電話、電気事業者関係等の被害を除く （主な被害推計額／住宅 1,496 億円、商工労働関係施設 281 億円、水産関係施設 215 億円、漁港施設 150 億円） (5) 被災世帯 4,582 世帯、11,979 人 ※被災世帯は罹災程度が半壊以上、発災時数値 【現況】 宮古市では、東日本大震災からの復興に向けたまちづくりを進めるため、次のとおり復興計画等を定めた。	
策定年月	計画名等
平成 23 年 6 月	宮古市震災復興基本方針
平成 23 年 10 月	宮古市東日本大震災復興計画【基本計画】
平成 24 年 3 月	宮古市東日本大震災復興計画【推進計画】 宮古市東日本大震災地区復興まちづくり計画
宮古市東日本大震災復興計画（以下、「本計画」という。）の計画期間は、平成 23 年度から令和元年度までの 9 年間とし、初めの 3 年間を「復旧期」、次の 3 年間を「再生期」、最後の 3 年間を「発展期」と位置付け、多岐にわたる復興対策の迅速かつ着実な実施を目指した。また、本計画では、復旧・復興事業にあたり重点的に取り組むべき方向として、「すまいと暮らしの再建」「産業・経済復興」「安全な地域づくり」の 3 つを復興の柱に掲げ、市民の総力を挙げて全市域一体となって取り組みを進めた。 計画期間満了後も、被災者の生活支援、心のケア、防災・減災対策、震災の記憶の伝承などに継続して取り組みながら、震災以降築き上げてきたまちづくりの土台を基礎に、さらなる発展に向けて取り組んでいる。	

○人口の状況

	平成 22 年度末	平成 28 年度末	令和 3 年度末
宮古市人口	59,636 人	54,573 人	48,761 人

○漁獲量の状況

(1) 宮古市魚市場の状況

	平成 22 年度	平成 28 年度	令和 3 年度
水揚量	4.4 万 t	2.4 万 t	2.4 万 t
水揚金額	74.4 億円	82.0 億円	40.0 億円

(2) 養殖漁業の状況

	平成 22 年度	平成 28 年度	令和 3 年度
水揚量	12.2 t	8.2 t	9.1 t
水揚金額	17.7 億円	19.0 億円	17.1 億円

○観光業の状況

	平成 22 年度	平成 28 年度	令和 3 年度
観光入込客数	1,242 千人	1,117 千人	994 千人

復興交付金事業計画における主要な事業結果の概要

所管省庁	復興交付金基幹事業名	事業内容	実施主体
文部科学省	埋蔵文化財発掘調査事業	埋蔵文化財発掘調査	宮古市
		・遺跡調査 ・記録作成のためのデジタル機器操作講習会（効果促進事業）	岩手県
農林水産省	農山漁村地域復興基盤総合整備事業	・農用地災害復旧関連区画整理 ・復興整備実施計画策定	岩手県
	農山漁村活性化プロジェクト支援（復興対策）事業	・広域総合交流促進施設復旧整備 ・施設内駐車場整備（効果促進事業） ・浄土ヶ浜公衆トイレ復旧、避難路周辺環境整備（効果促進事業） ・観光イベント開催、観光情報発信 等（効果促進事業） ・金浜地区集会施設復旧整備 ・野外活動交流促進施設復旧整備 ・施設周辺避難路整備（効果促進事業）	宮古市
	被災地域農業復興総合支援事業	農業機械の購入	宮古市
	漁業集落防災機能強化事業	・対象漁業集落の防災機能強化のための宅地整備、漁業集落道整備、津波避難路整備 等 ・周辺学校施設の擁壁復旧整備（効果促進事業）	宮古市
	漁港施設機能強化事業	・漁港施設用地嵩上げ工事	宮古市
	水産業共同利用施設復興整備事業	・水産加工流通施設整備補助 ・水産加工機器整備補助（効果促進事業）	宮古市

農林水産省		<ul style="list-style-type: none"> ・水産物消費拡大、地場産業育成、販路開拓等のイベント開催（効果促進事業） ・労働環境対策施設整備 ・魚市場増築工事 ・魚市場拡張のための用地取得、嵩上げ、付帯設備整備（効果促進事業） ・魚市場既設棟改修工事（効果促進事業） ・水産加工団地整備 ・海洋汚染防止機材保管倉庫整備 	
	木質バイオマス施設等緊急整備事業	木質バイオマス活用事業化可能性調査（効果促進）	宮古市
	漁業集落復興効果促進事業	水産体験交流施設整備 等 田老漁港の船揚場改良 等	宮古市 岩手県
国土交通省	道路事業（市街地相互の接続道路等）	<ul style="list-style-type: none"> ・道路整備 ・事業実施事前調査設計（効果促進事業） 	岩手県
		・道路整備	宮古市
	災害公営住宅整備事業	<ul style="list-style-type: none"> ・災害公営住宅整備 ・公営住宅内駐車場整備（効果促進事業） ・建設用地内の建物除却（効果促進事業） ・改修による公営住宅整備のための既存入居者移転補償（効果促進事業） ・公営住宅長寿命化計画策定、入居者等管理システム導入（効果促進事業） 	宮古市
		<ul style="list-style-type: none"> ・災害公営住宅整備 ・公営住宅内駐車場整備（効果促進事業） 	岩手県
	災害公営住宅家賃低廉化事業	県災害公営住宅入居者の家賃低廉化	岩手県
		市災害公営住宅入居者の家賃低廉化	宮古市
	東日本大震災特別家賃低減事業	県災害公営住宅入居者の特別家賃低減化	岩手県
		市災害公営住宅入居者の特別家賃低減化	宮古市
	住宅・建築物安全ストック形成事業（がけ地近接等危険住宅移転事業）	危険住宅移転費補助	宮古市
	津波復興拠点整備事業	<ul style="list-style-type: none"> ・中心市街地拠点施設整備 ・津軽石地区津波復興拠点整備 ・法の脇地区津波浸水防護施設整備（効果促進事業） 	宮古市
	都市再生区画整理事業（被災市街地復興土地区画整理事業）	<ul style="list-style-type: none"> ・都市区画整理事業計画案作成 ・公共施設充当用地の先行取得 ・対象区域内の道路・公園等整備、地盤の一部嵩上げ、住宅・産業用地整備 等 ・対象区域内の宅地地盤適正化（嵩上げ）工事（効果促進事業） ・津波遺構施設、施設内駐車場整備（効果促進事業） 	宮古市
	都市防災推進事業（都市防災総合推進事業）	<ul style="list-style-type: none"> ・宮古市復興まちづくり計画策定 ・津波遺構施設保存整備のための調査（効果促進事業） ・都市防災総合推進事業計画策定 ・災害記録関係資料の収集整理、震災記録誌作成（効果促進事業） ・避難誘導標識、避難地案内板の設置（効果促進事業） 	宮古市

国土交通省		<ul style="list-style-type: none"> ・防災士養成研修講座の実施、防災学習教材作成（効果促進事業） ・災害用給水機材等格納倉庫、給水車の整備（効果促進事業） ・藤原地区避難路整備 	
	下水道事業	<ul style="list-style-type: none"> ・雨水ポンプ場整備 ・区画整理事業区域内の下水道管渠施設整備 	宮古市
	都市公園事業	防災公園整備検討のための調査	宮古市
	防災集団移転促進事業	<ul style="list-style-type: none"> ・移転促進区域の被災者所有地の買取り、住宅団地整備、移転費等の助成 等 ・宮古市公共交通ビジョン策定（効果促進事業） ・埋蔵文化財整理収蔵施設整備（効果促進事業） 	宮古市
	市街地復興効果促進事業	<ul style="list-style-type: none"> ・応急仮設住宅建設時に撤去した公園遊具の復旧 ・中心市街地拠点施設付近の既存踏切の拡幅、道路線形の改良 等 ・区画整理事業のための測量、調査、換地設計 ・区画整理事業区域内のがれき除去 ・区画整理事業区域内の下水道管渠布設 ・田老地区産直交流施設整備 ・津波遺構施設へのエレベーター設置 ・防災集団移転促進事業区域内の水道施設整備 ・日出島地区津波避難路整備（道路改良）等 	宮古市
		簡易宿泊施設整備 等	岩手県
環境省	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	浄化槽整備	宮古市

復興交付金事業計画の実績に関する総合評価

○復興まちづくりにおける復興交付金事業計画の有用性、経済性

住民の意向を反映させた住宅団地や災害公営住宅の整備、甚大な被害を受けた漁港施設の早期復旧、迅速で安全な避難を可能とする津波避難路の整備、今後の災害時の拠点となる中心市街地拠点施設の整備など、本事業計画により実施した事業はいずれも有効性が高く、また、各種規定に基づき適正に事業費積算や業者選定が行われており、経済性にも十分留意されていると判断できる。

○復興交付金事業計画の実施に当たり、県又は市町村において改善が可能であった点特になし

○総合評価

本事業計画に基づく各事業の実施により、宮古市復興計画の3つの柱である「すまいと暮らしの再建」「産業・経済復興」「安全な地域づくり」が円滑に推進され、被災した施設・設備等の早期復旧と市の復興に大きく寄与したことから、本事業計画は有用であったと評価できる。

評価の透明性、客観性、公正性を確保するための取組

市事業においては、事業部局が評価を作成、評価部局の企画部企画課で内容の確認を行ったほか、市ホームページにおいてパブリック・コメントを実施し、評価に関する透明性、客観性、公正性を図った。


なお、県事業においては、事業を所管する室課と評価を実施する復興防災部復興推進課とを分離する取組を実施した（県事業は全市町村で評価部局の分離の取組を実施）。

担当部局


岩手県復興防災部復興推進課 電話番号：019-629-6935

宮古市企画部企画課 電話番号：0193-68-9064

主な復興交付金事業（1／3）

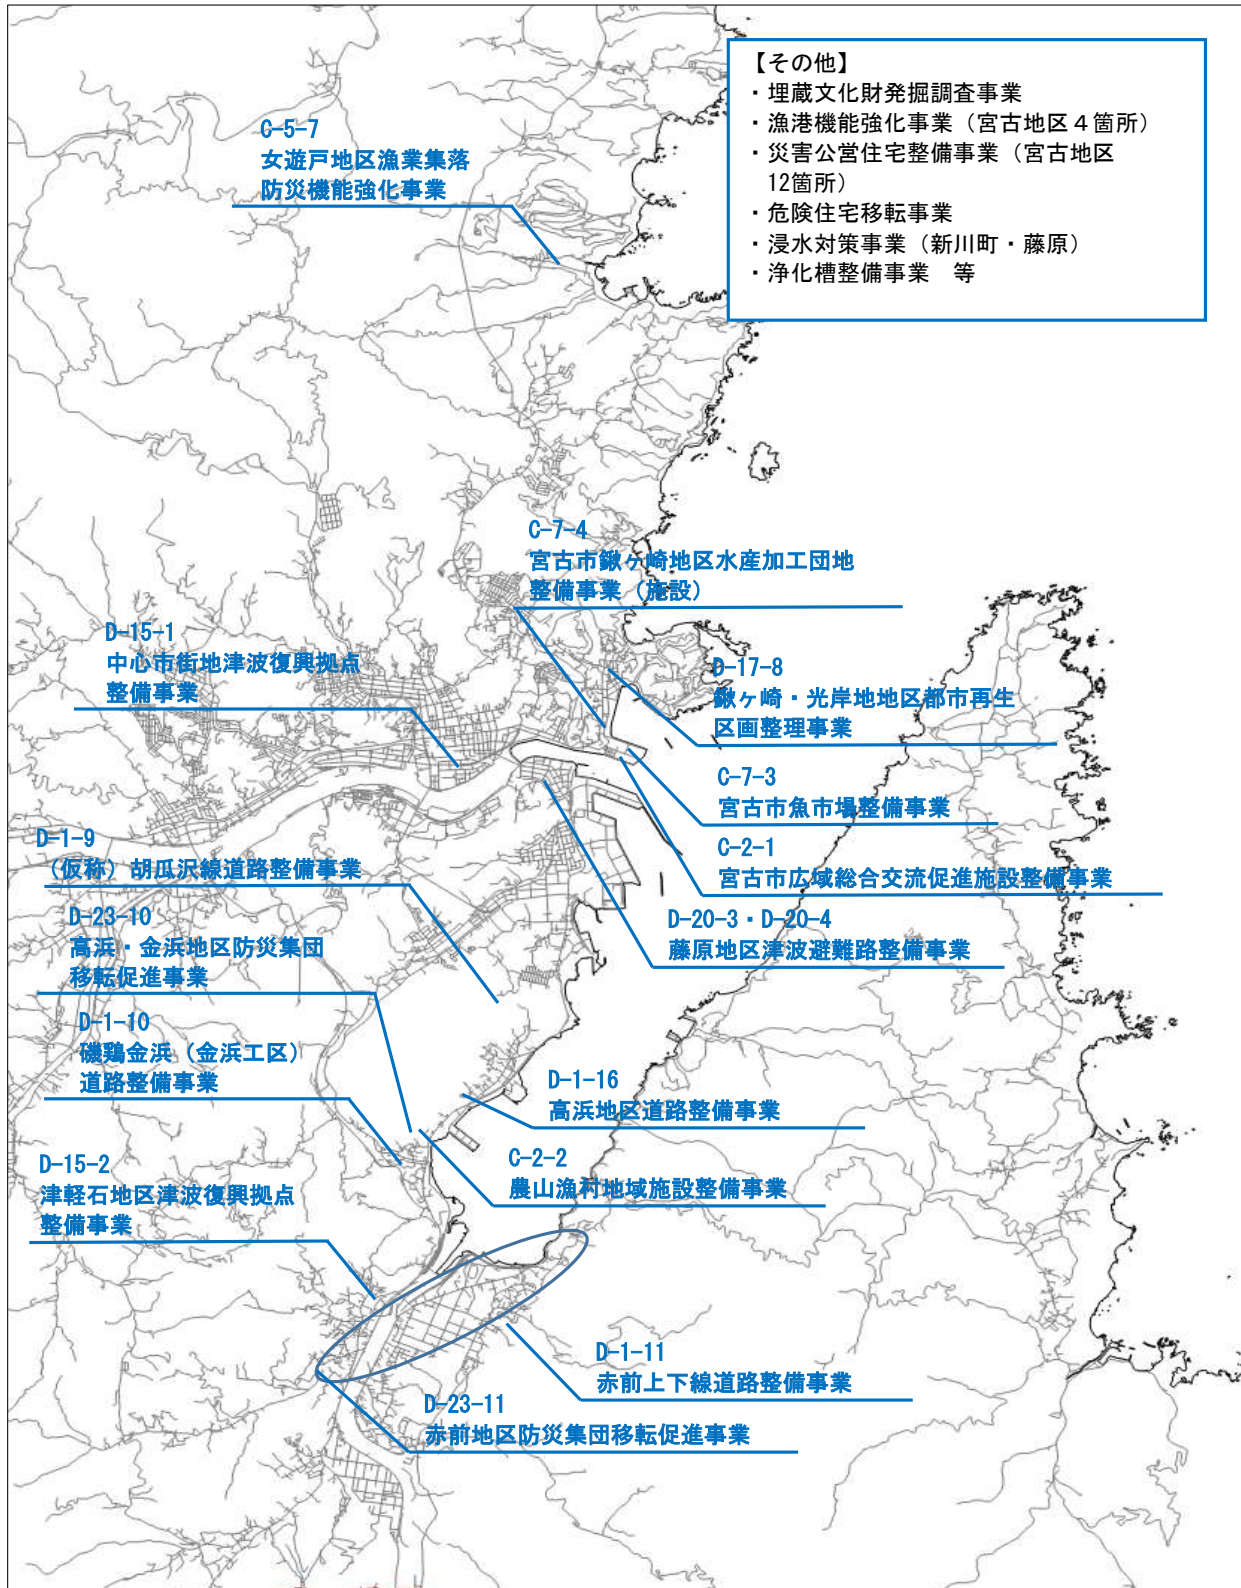

主な復興交付金事業（2／3）

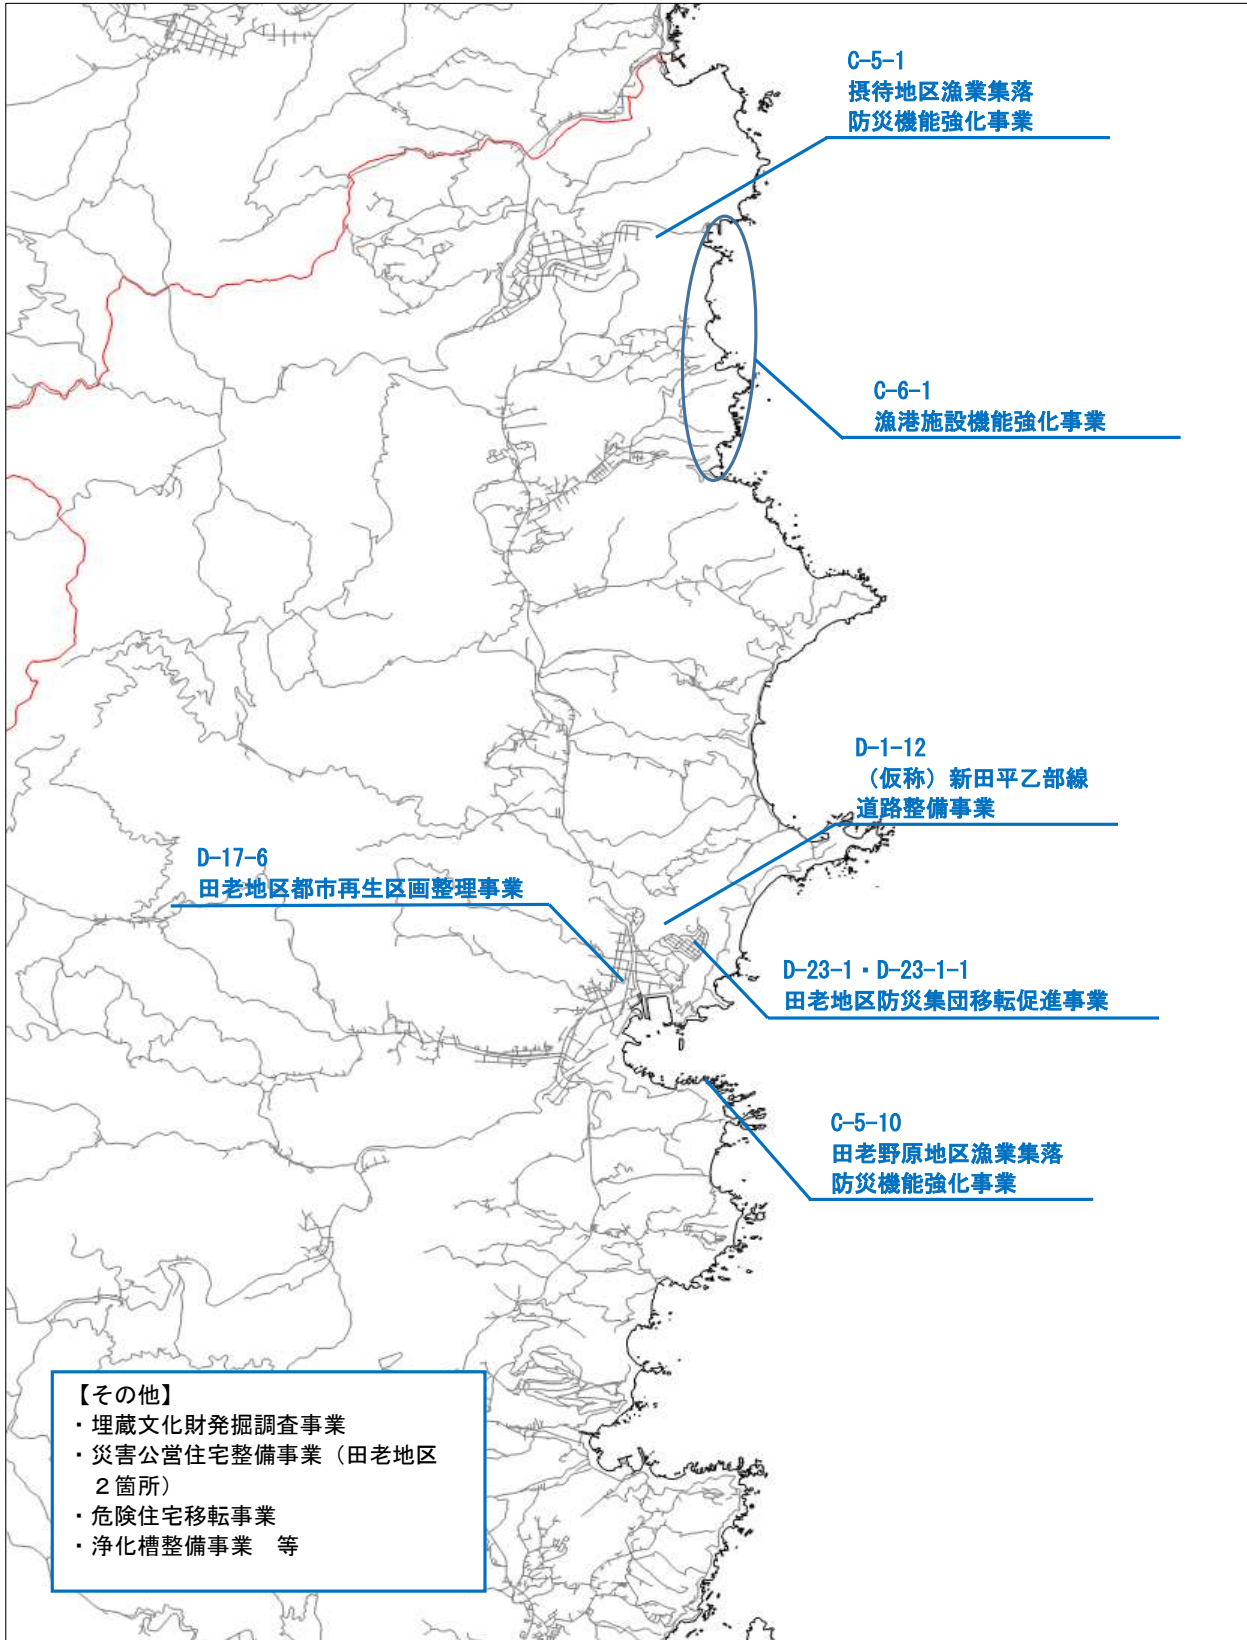

主な復興交付金事業（3 / 3）

